深谷市
橋梁長寿命化修繕計画
道路附属物長寿命化修繕計画

2024 年 4 月

深谷市　都市整備部　道路管理課

－ 目　次 －

1.　背景・目的 2
2.　長寿命化修繕計画の概要 3
2.1.　対象橋梁 3
2.2.　計画期間 3
3.　老朽化対策における基本方針 4
4.　新技術等の活用方針 6
5.　集約化・撤去等の検討 6
6.　費用の縮減に関する具体的な方針 7
6.1.　費用の縮減に関する方針 7
6.2.　長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果 7
7.　個別施設計画 7

1. 背景・目的

本市が管理する橋梁は、2024 年(令和 6 年)3 月末現在で 788 橋であり、このうち、建設後 50 年を経過する橋梁は全体の約 65%を占めており、20 年後には約 89%に増加する状況となっている。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の「対症療法型」の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架替に要する費用が増大となることが懸念される。そのため、従来の「対症療法型」から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う「予防保全型」への転換が必要である。

このような背景から、本市では 2019 年(平成 31 年)3 月に深谷市橋梁長寿命化修繕計画を策定し、また 2022 年(令和 4 年)3 月に計画の改定を実施することによって、計画的な補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、施設の安全性はもとより、総コストの低減と予算の平準化を図り、計画的・効率的な老朽化対策を進めてきた。

また本市では、国が定めた点検要領に基づき、5 年に一度の法定点検を実施しており、2023 年度(令和 5 年度)に 2 巡目の定期点検が完了したことにより、全管理橋梁の健全性に関するデータの収集・把握が可能となった。

そこで本市では、最新の定期点検結果および補修対策等の実績を踏まえて、管理橋梁の長寿命化および修繕・架替に係る費用の縮減に関する基本的な方針を見直すとともに、管理水準や劣化予測方法、補修工法、補修単価などを見直すことにより、深谷市橋梁長寿命化修繕計画の改定を行った。

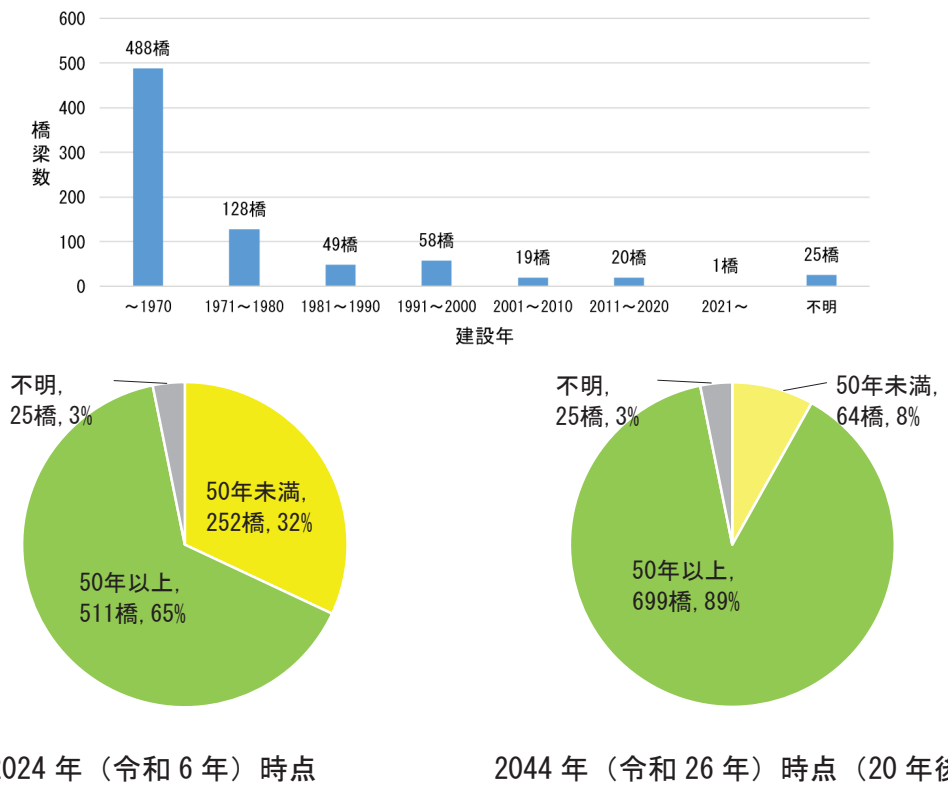

図 1　建設年の分布と建設後 50 年が経過している橋梁の割合

2. 長寿命化修繕計画の概要

2.1. 対象橋梁

深谷市橋梁長寿命化修繕計画では、本市が管理する全 788 橋を対象としている。

表 1　対象橋梁

単位：橋

	橋長15m以上	橋長15m未満	合計
橋梁	90	697	787
道路附属物	1	0	1
合計	91	697	788

2.2. 計画期間

橋梁の健全性は、経年劣化や疲労等によって時間経過と共に変化することから、定期点検サイクル等を考慮し、計画期間を設定したうえで、最新の定期点検結果および補修対策等の実績を踏まえ、適宜計画を更新するものとする。

本計画では、今後 50 年間の橋梁維持管理における事業費の推移を示すために、シミュレーションの実施による修繕費用の予測結果を用いて中長期計画を立案したうえで、今後 10 年間を短期修繕計画と位置づけて点検計画や修繕計画を立案した。

3. 老朽化対策における基本方針

本市では定期点検における健全性の診断結果を踏まえ、早期措置段階である健全性Ⅲの橋梁について優先的に補修を行うことによって、「対症療法型」から「予防保全型」へ移行し、中長期的な修繕費用を考慮した予算計画によるトータルコストの縮減を図ることとしていた。

2023 年度(令和 5 年度)に完了した 2 巡目の定期点検結果では、健全性Ⅲと判定された橋梁は対象橋梁 788 橋のうち 2 橋と全体の 1%以下となっており、本市における橋梁維持管理は予防保全型へ概ね移行している状況である。

そこで、今後も予防保全型の維持管理を継続することを目的とし、交通量や路線重要度を勘案した新たな管理区分 A~C を設けることによって対策優先順位を決定した。

表 2　健全性の判定区分

健全性判定区分		状態
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態。

※出典：道路橋定期点検要領（平成３１年２月 国土交通省 道路局）

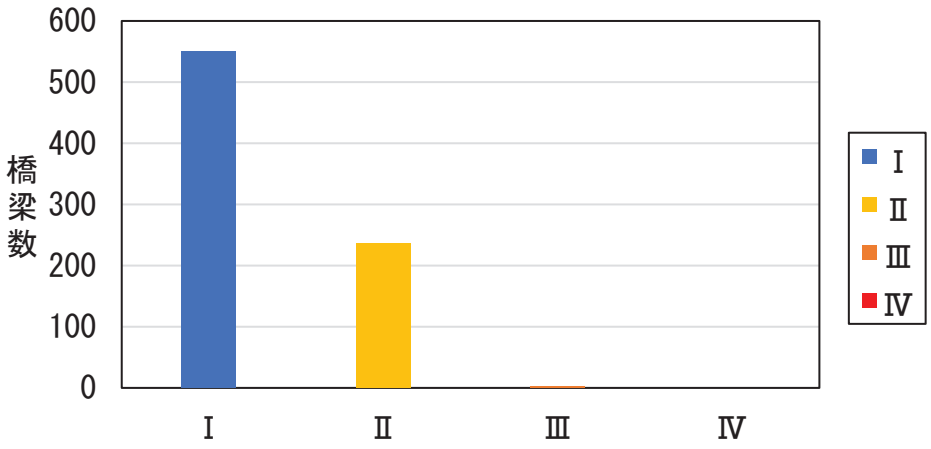

図 2　健全性判定区分ごとの橋梁数

表 3　管理区分ごとの条件

管理区分	条件
管理区分A	・幹線道路に該当する橋梁 ・緊急輸送道路、跨線橋または跨道橋、4車線道路のいずれかに該当する橋梁
管理区分B	・管理区分A以外の橋梁 ・緊急輸送道路、跨線橋または跨道橋、4車線または2車線道路、橋長15mのいずれかに該当する橋梁
管理区分C	・管理区分AおよびB以外の橋梁

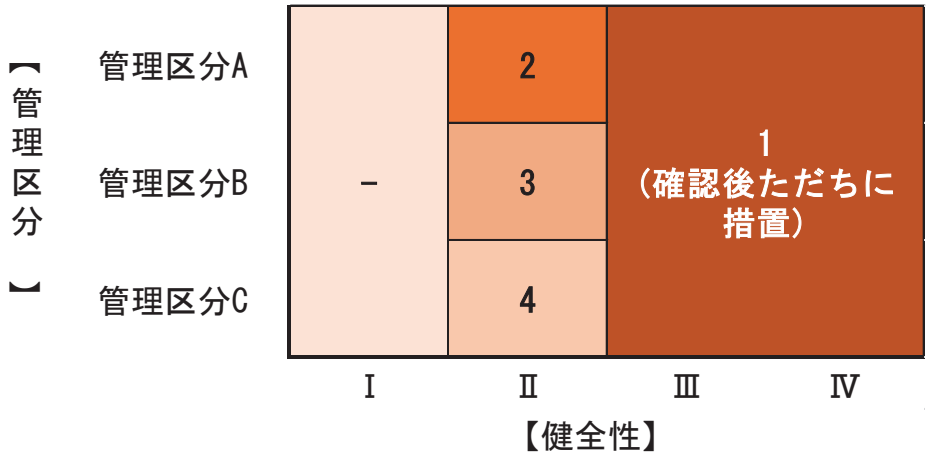

図 3　橋梁の対策の優先順位

4. 新技術等の活用方針

定期点検および補修工事のコスト縮減や効率化などを図るために、新技術情報提供システム（NETIS）に掲載されている技術の活用を検討することによって、定期点検および補修工事における新技術等の活用に関する短期的な数値目標およびそのコストを設定した。

【定期点検】

今後 5 年間の橋梁定期点検にて、管理橋梁のうち 23 橋に対して橋梁点検ロボットカメラ等の新技術を活用することによって、従来の点検業務価格に対して約 8%（約 126 万円）のコスト縮減を目指す。

【補修工事】

今後 10 年間の橋梁補修工事にて、管理橋梁のうち 45 橋に対して、ひび割れの補修工法の新技術等を活用することによって、従来の補修工事価格に対して約 3%（約 77 万円）のコスト縮減を目指す。

5. 集約化・撤去等の検討

今後 50 年間の橋梁維持管理における事業費の抑制、日常管理を担っている維持業者の不足、将来人口の減少が見込まれる中、利用者数を見据えた対応が必要と考え、集約化・撤去について検討することによって、集約化・撤去に関する短期的な数値目標およびそのコストを設定した。

今後 10 年間にて、管理橋梁のうち老朽化が著しく、機能の集約が期待される 1 橋において集約化・撤去を検討・実施し、約 180 万円のコスト縮減を目指す。

6. 費用の縮減に関する具体的な方針

6.1. 費用の縮減に関する方針

今後、橋梁の維持管理費および更新費の増加が懸念される中、持続可能な道路管理を実現するためには、予防保全型による橋梁維持管理費の削減のほか、地域の実情や利用状況などに応じ、集約化・撤去を選択肢として検討していくことが重要である。

そこで本市では、今後の橋梁維持管理費の削減のため、新技術の活用を検討し、積極的に新技術を採用していくとともに、集約化・撤去を検討し、集約化・撤去による地域住民へのサービス提供の低下を最小限に抑えつつ、対象となる橋梁を選定する方針とする。

6.2. 長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果

近年の本市における橋梁維持管理予算に基づき平準化を行うことによって立案した今後 50 年間の中長期計画について、「対症療法型」と「予防保全型」の事業費を比較すると、「対症療法型」が 68 億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が 51 億円となり、コスト縮減効果は 17 億円（25%）となった。

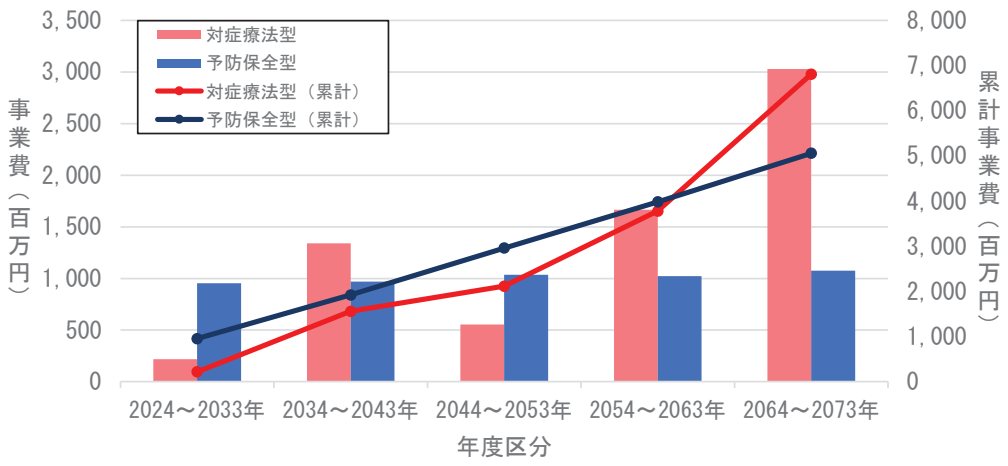

図 4　長寿命化計画によるコスト縮減効果

7. 個別施設計画

次頁以降に示す。

深谷市橋梁長寿命化修繕計画案

【凡例】 ：点検　対策　：対策

橋梁諸元						直近の定期点検記録		点検・修繕時期と対策内容																									
								修繕計画												概算修繕金額(千円)													
No.	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	年度	判定区分	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	対策費(千円)	対策部材
1	A-2橋1	市道A-106号	2.5	2.1	1967	2019	Ⅰ																						
2	A-3橋1	市道A-105号	2.5	2.1	1967	2019	Ⅰ																						
3	A-4橋1	市道A-104号	2.2	2.1	1967	2019	Ⅰ																						
4	A-5橋1	市道A-103号	2.5	2.1	1967	2019	Ⅰ																						
5	A-21橋1	市道A-294号	2.8	5.0	2018	2019	Ⅰ																						
6	A-31橋	市道A-283号	2.4	3.1	1967	2021	Ⅰ																						
7	A-38橋	市道A-119号	2.9	2.1	1967	2021	Ⅰ																						
8	A-40橋	市道A-246号	2.2	3.0	1967	2022	Ⅰ																						
9	A-41橋	市道A-244号	2.4	3.0	1967	2021	Ⅰ																						
10	A-42橋	市道A-249号	2.4	2.0	1967	2019	Ⅰ																						
11	A-43橋	市道A-248号	2.2	2.0	1967	2019	Ⅰ																						
12	雷電木橋	市道A-241号	16.5	7.2	2004	2021	Ⅰ																						
13	A-48橋	市道A-134号	5.0	4.8	1967	2021	Ⅰ																						
14	A-49橋	市道A-137号	4.4	3.7	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
15	A-50橋	市道幹17号	5.2	6.7	1967	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁
16	A-51橋	市道A-207号	4.7	4.0	1967	2021	Ⅰ																						
17	A-52橋	市道A-206号	4.1	3.2	1967	2020	Ⅰ																						
18	A-53橋	市道A-201号	4.4	6.7	1967	2021	Ⅰ																						
19	A-54橋	市道A-180号	4.5	3.2	1967	2020	Ⅰ																						
20	A-55橋	市道A-181号	4.5	3.2	1967	2020	Ⅰ																						
21	A-56橋	市道A-184号	4.4	4.7	1967	2020	Ⅰ																						
22	A-60橋	市道A-179号	3.8	5.1	2011	2022	Ⅰ																						
23	A-61橋	市道A-182号	4.3	4.6	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
24	A-70橋	市道A-183号	4.4	2.5	1967	2020	Ⅰ																						
25	A-71橋	市道A-190号	6.3	3.1	1967	2021	Ⅰ																						
26	A-75橋	市道A-438号	6.3	3.1	1967	2021	Ⅰ																						
27	A-77橋	市道A-437号	6.4	3.8	1967	2021	Ⅰ																						
28	A-78橋	市道A-435号	6.4	3.7	1967	2021	Ⅰ																						
29	A-80橋	市道A-434号	6.4	3.7	1967	2021	Ⅰ																						
30	A-81橋	市道幹20号	6.4	4.7	1967	2020	Ⅰ																						
31	A-82橋	市道A-432号	6.4	3.7	1967	2021	Ⅰ																						
32	A-83橋	市道A-429号	8.0	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
33	A-85橋	市道A-427号	7.4	3.7	1967	2021	Ⅰ																						
34	A-86橋	市道A-460号	9.1	3.7	1967	2021	Ⅰ																						
35	A-87橋	市道A-419号	7.3	3.7	1967	2021	Ⅰ																						
36	A-101橋	市道A-1072号	2.4	2.9	1967	2020	Ⅰ																						
37	睦橋	市道A-365号	13.9	4.0	2001	2019	Ⅰ																						
38	くすのき橋	市道A-365号	11.3	4.0	2001	2019	Ⅰ																						
40	A-107橋	市道A-314号	2.3	4.5	2018	2019	Ⅰ																						
41	A-109橋	市道A-316号	2.8	4.5	2018	2019	Ⅰ																						
42	A-110橋	市道A-318号	2.4	5.2	1967	2020	Ⅰ																						
48	A-136橋	市道A-620号	6.1	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
49	伊勢島橋	市道A-586号	15.9	5.2	1999	2022	Ⅰ																						
50	中河原橋	市道A-578号	21.8	6.2	1994	2021	Ⅰ									修繕										13,600		13,600	主桁
51	新田橋	市道A-535号	18.5	7.2	1995	2019	Ⅰ																						
52	新合橋	市道A-567号	24.5	6.2	1994	2021	Ⅰ																						
53	上石橋	市道A-542号	23.6	7.2	1993	2019	Ⅰ																						
56	明戸橋	市道A-539号	23.7	6.2	1992	2019	Ⅰ																						
57	鹿島橋	市道幹14号	21.6	7.8	1974	2020	Ⅰ																						
58	A-157橋	市道A-484号	21.1	4.7	1980	2019	Ⅰ																						
65	A-168橋	市道A-800号	2.1	5.4	1980	2020	Ⅰ																						
66	A-171橋	市道A-810号	2.6	6.0	1980	2020	Ⅰ																						
67	A-172橋	市道A-812号	2.6	8.0	1980	2020	Ⅰ																						
68	A-173橋	市道A-983号	2.2	4.9	1980	2020	Ⅰ																						
69	A-174橋	市道A-978号	2.3	4.4	1980	2020	Ⅰ																						
70	A-175橋	市道A-1010号	2.3	4.5	1980	2020	Ⅰ																						
71	A-176橋	市道A-1009号	2.3	5.1	1980	2020	Ⅰ																						
72	A-177橋	市道A-989号	2.3	4.9	1980	2020	Ⅰ																						
73	A-178橋	市道A-1008号	2.3	4.9	1980	2020	Ⅱ									修繕										1,100		1,100	主桁
74	A-179橋	市道A-967号	2.9	12.8	1980	2020	Ⅱ								修繕										3,100			3,100	主桁,下部工
82	A-189橋	市道幹1号	2.9	10.8	1980	2020	Ⅰ																						
83	A-190橋	市道A-716号	2.9	3.2	1980	2020	Ⅰ																						
84	A-191橋	市道A-714号	2.3	5.0	1980	2020	Ⅰ																						
86	A-193橋	市道A-718号	2.9	5.8	1967	2020	Ⅰ																						
87	A-199橋	市道A-691号	7.0	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
88	A-200橋	市道A-692号	7.0	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
89	A-201橋	市道A-701号	7.0	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
90	A-202橋	市道幹15号	7.7	5.8	1967	2019	Ⅰ																						
91	A-203橋	市道A-857号	7.3	4.7	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,800			1,800	床版
92	A-204橋	市道A-861号	7.4	4.7	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
93	A-206橋	市道A-882号	7.8	4.7	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	床版
94	A-207橋	市道A-864号	8.1	4.7	1967	2019	Ⅰ																						
95	A-208橋	市道A-892号	8.4	4.8	1967	2019	Ⅰ																						
96	A-209橋	市道A-893号	8.4	4.7	1967	2019	Ⅰ																						
97	A-210橋	市道A-879号	7.6	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
98	A-211橋	市道A-904号	7.3	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
99	A-212橋	市道幹15号	7.3	4.7	1967	2020	Ⅰ																						
100	A-213橋	市道A-910号	7.3	4.7	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,800			1,800	床版
101	A-214橋	市道A-941号	7.3	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
102	A-218橋	市道A-955号	5.0	4.5	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
103	A-219橋	市道A-944号	4.4	3.6	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
104	A-221橋	市道A-919号	9.0	4.7	1967	2019	Ⅰ																						
107	A-230橋	市道A-968号	2.3	4.5	1967	2021	Ⅰ																						
108	A-231橋	市道A-1017号	2.9	8.1	1967	2021	Ⅰ																						
109	A-232橋	市道A-1026号	5.6	4.5	1967	2021	Ⅰ																						
118	A-249橋	市道A-995号	2.3	4.9	1967	2021	Ⅰ																						
119	A-250橋	市道A-1009号	2.3	4.9	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
122	A-254橋	市道A-834号	7.1	8.8	1967	2019	Ⅰ																						
123	青淵橋	市道A-256号	16.3	4.0	2004	2022	Ⅰ																						
124	矢島大橋	市道幹20号	113.9	4.5	1958	2021	Ⅱ			修繕										20,900								20,900	主桁, 床版,下部工
125	西浦橋	市道A-1073号	14.6	13.8	2001	2022	Ⅰ																						
126	青淵見晴橋	市道A-1073号	24.4	13.8	2003	2019	Ⅰ									修繕										10,000		10,000	主桁
127	藍香橋	市道A-318号	13.1	7.2	2002	2019	Ⅰ																						
128	宿橋	市道A-318号	16.3	7.8	1999	2019	Ⅰ																						
129	中通橋	市道B-204号	2.5	3.5	1993	2020	Ⅰ																						
130	一橋	市道B-205号	2.9	7.4	1993	2021	Ⅰ																						
131	長塚橋	市道B-206号	2.6	3.5	1967	2020	Ⅰ																						
132	大塚橋	市道幹20号	2.8	3.9	1967	2020	Ⅰ																						
133	B-7橋	市道B-17号	2.4	9.0	1967	2021	Ⅰ																						
135	B-9橋1	市道幹19号	2.4	11.0	1967	2021	Ⅰ																						
136	B-10橋1	市道B-101号	3.1	2.0	1967	2021	Ⅲ																						
137	B-11橋1	市道B-85号	4.2	3.2	1967	2021	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
138	B-12橋1	市道B-100号	3.2	2.0	1967	2021	Ⅰ																						
139	B-13橋1	市道幹7号	4.4	8.4	1967	2021	Ⅰ																						
140	北谷田橋	市道B-193号	3.2	3.4	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
141	B-15橋1	市道B-159号	2.4	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
142	B-16橋1	市道B-161号	2.4	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
143	B-17橋1	市道B-162号	2.0	5.1	1967	2022	Ⅰ																						
144	B-18橋1	市道幹20号	2.3	7.5	1967	2019	Ⅰ																						
145	B-19橋1	市道B-208号	2.4	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
146	B-20橋1	市道B-209号	2.4	8.1	1967	2019	Ⅰ																						
147	福祉橋	市道幹20号	13.1	4.0	1963	2019	Ⅰ										修繕										2,400	2,400	主桁, 床版,下部工
148	B-23橋1	市道B-64号	12.8	3.4	1943	2019	Ⅰ																						
149	B-24橋1	市道B-192号	3.4	2.6	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
150	B-25橋	市道B-190号	3.4	2.6	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁,下部工
151	B-26橋1	市道B-188号	3.4	7.0	1967	2019	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
152	B-27橋	市道B-185号	3.7	2.6	2015	2022	Ⅰ																						
153	田中橋	市道幹6号	23.0	8.2	1997	2019	Ⅰ																						
154	起会橋	市道B-241号	22.7	6.2	2000	2021	Ⅰ																						
155	菱川橋	市道B-244号	22.8	9.2	2001	2021	Ⅰ																						
156	田谷大橋	市道幹1号	22.6	9.2	1997	2019	Ⅰ																						
157	弁天橋	市道幹27号	30.0	7.2	1995	2020	Ⅰ																						
159	八日市橋	市道B-607号	30.3	6.2	1995	2022	Ⅰ																						
163	B-45橋	市道B-585号	2.1	5.8	1967	2022	Ⅰ																						
165	B-50橋1	市道B-572号	2.8	5.8	1967	2021	Ⅰ																						
166	B-52橋1	市道B-540号	2.6	16.6	1970	2021	Ⅰ																						
167	B-53橋1	市道B-522号	2.3	7.8	2006	2021	Ⅰ																						
168	上敷免橋	市道幹27号	12.3	4.6	1972	2019	Ⅰ																						
169	八号橋	市道B-486号	31.5	6.2	1988	2021	Ⅱ					修繕										1,600						1,600	下部工
170	七号橋	市道B-491号	34.5	6.2	1986	2021	Ⅱ					修繕										1,700						1,700	下部工
171	六号橋	市道幹19号	31.7	6.2	1987	2020	Ⅰ																						

【凡例】 ：点検　対策　：対策

橋梁諸元						直近の定期点検記録		点検・修繕時期と対策内容																							
								修繕計画												概算修繕金額(千円)											
No.	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	年度	判定区分	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	対策費(千円)	対策部材
172	森下橋1	市道幹7号	38.3	7.8	1971	2020	Ⅱ					修繕										15,400						15,400	床版
173	四号橋	市道B-309号	29.1	5.7	1987	2020	Ⅰ																						
174	唐沢3号橋	市道幹20号	28.9	8.2	1989	2020	Ⅱ				修繕										14,300							14,300	床版,下部工
175	二号橋	市道B-276号	28.1	5.7	1988	2020	Ⅰ																						
180	B-67橋	市道B-386号	2.3	3.8	1967	2021	Ⅰ																						
183	大堀橋	市道幹1号	5.4	8.8	1974	2019	Ⅰ																						
184	B-72橋	市道幹1号	2.3	16.3	1948	2021	Ⅰ																						
186	B-76橋	市道B-323号	4.0	3.3	1967	2021	Ⅰ																						
187	B-77橋	市道B-329号	3.8	2.1	1967	2021	Ⅰ																						
188	B-78橋	市道B-334号	3.6	2.2	1967	2021	Ⅰ																						
189	B-79橋	市道幹20号	6.4	7.8	1967	2019	Ⅰ																						
190	B-80橋	市道B-255号	4.7	7.2	1967	2022	Ⅱ								修繕											1,100		1,100	主桁
191	入川橋	市道幹18号	131.8	5.1	1975	2020	Ⅰ																						
192	高塚橋	市道幹1号	126.2	9.7	1977	2022	Ⅰ									修繕										7,100		7,100	下部工
193	上大橋	市道幹18号	13.9	7.2	1996	2019	Ⅰ																						
194	宮橋	市道B-462号	16.4	3.0	1980	2021	Ⅰ									修繕										2,500		2,500	床版
195	中橋	市道B-464号	12.1	4.5	1956	2019	Ⅱ								修繕										1,600			1,600	主桁
196	B-86橋	市道B-464号	5.9	7.9	1956	2021	Ⅰ																						
197	B-87橋	市道B-465号	2.1	2.9	1956	2019	Ⅰ																						
198	B-88橋	市道幹1号	17.6	9.7	1974	2021	Ⅰ									修繕										5,400		5,400	主桁, 床版
199	地蔵橋	市道B-502号	12.5	3.9	1960	2019	Ⅱ								修繕										1,400			1,400	主桁
200	城西橋	市道B-603号	29.8	6.2	2000	2022	Ⅰ																						
201	B-102橋	市道幹6号	5.4	7.7	1948	2019	Ⅰ																						
202	あかね橋	市道歩1号	30.7	8.0	1993	2021	Ⅰ									修繕										9,400		9,400	主桁,下部工
203	上谷田橋	市道B-631号	19.2	6.2	1999	2021	Ⅰ																						
205	C-14橋	市道幹13号	3.4	12.2	1967	2022	Ⅰ																						
208	C-44橋	市道幹23号	4.6	7.5	1967	2021	Ⅰ																						
209	C-46橋	市道C-103号	4.6	8.2	1967	2021	Ⅰ																						
210	C-48橋	市道幹24号	5.3	6.6	1967	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁
212	C-52橋	市道C-134号	5.3	6.5	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
213	C-53橋	市道C-131号	5.3	4.6	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
214	C-55橋	市道C-127号	5.3	4.6	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
215	明戸水門橋	市道C-736号	8.6	3.6	1967	2021	Ⅰ																						
216	C-60橋	市道C-337号	5.4	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
217	C-61橋	市道幹22号	5.0	12.2	1967	2022	Ⅱ			修繕										1,800								1,800	主桁
218	C-62橋	市道C-374号	5.4	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
219	C-63橋	市道C-375号	5.3	6.6	1967	2021	Ⅰ																						
220	蓮藤橋	市道幹51号	8.2	13.0	1992	2019	Ⅰ																						
221	C-65橋	市道C-379号	5.3	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
222	C-66橋	市道幹51号	2.5	12.4	1967	2022	Ⅰ																						
223	C-67橋	市道幹12号	2.7	10.1	1967	2020	Ⅰ																						
224	C-68橋	市道C-444号	2.2	8.0	1967	2021	Ⅰ																						
225	諏訪西橋	市道C-10号	13.6	7.0	1977	2019	Ⅰ																						
226	新沼橋	市道C-26号	10.8	6.0	1981	2019	Ⅰ																						
228	江原橋	市道C-438号	17.1	7.2	1993	2019	Ⅰ																						
229	堀米橋	市道C-431号	11.9	5.5	1965	2019	Ⅰ																						
231	栄橋	市道幹13号	16.0	11.0	1992	2022	Ⅰ																						
232	C-78橋	市道C-701号	3.4	3.9	1977	2022	Ⅰ																						
237	C-92橋	市道C-179号	3.2	4.0	1977	2022	Ⅰ																						
239	新江原橋	市道幹51号	17.2	12.6	1993	2019	Ⅰ																						
240	D-1橋	市道D-1号	3.2	4.2	1993	2022	Ⅰ																						
241	D-2橋1	市道D-12号	3.1	5.0	1967	2021	Ⅰ																						
242	D-3橋1	市道D-2号	3.1	5.0	1967	2021	Ⅰ																						
243	D-4橋1	市道D-3号	3.1	5.0	1967	2021	Ⅰ																						
246	D-18橋1	市道D-57号	2.9	5.6	1967	2021	Ⅰ																						
247	D-19橋1	市道D-32号	2.8	6.3	1967	2021	Ⅰ																						
248	D-20橋	市道D-18号	3.0	5.0	1967	2022	Ⅰ																						
249	D-21橋	市道D-25号	3.0	6.2	1967	2022	Ⅰ																						
250	D-22橋	市道D-20号	3.0	5.0	1967	2022	Ⅰ																						
259	康田橋	市道D-116号	22.5	7.2	1998	2021	Ⅰ																						
271	森西橋	市道D-147号	24.9	7.5	1980	2021	Ⅱ					修繕										5,000						5,000	床版
272	智形橋	市道D-155号	24.7	7.9	1975	2022	Ⅱ					修繕										21,600						21,600	主桁, 支承部
273	唐沢橋	市道D-220号	23.9	8.5	1985	2019	Ⅰ																						
274	新橋	市道D-228号	24.6	7.2	1984	2020	Ⅱ		修繕	修繕									25,000	5,500								30,500	主桁,床版,支承部
275	日英橋	市道D-229号	20.8	8.0	1978	2020	Ⅰ																						
276	東橋	市道幹29号	15.9	6.6	1960	2021	Ⅱ		修繕										4,600									4,600	主桁, 床版,下部工
277	つばき橋	市道歩1号	13.7	3.8	1985	2019	Ⅰ																						
280	D-64橋	市道幹33号	2.9	8.1	1985	2022	Ⅰ																						
281	D-65橋	市道D-381号	2.8	5.0	1985	2022	Ⅰ																						
282	D-66橋	市道D-407号	4.3	4.0	1985	2022	Ⅰ																						
283	D-72橋	市道D-511号	2.6	5.0	1967	2022	Ⅰ																						
284	D-73橋	市道D-455号	2.5	7.0	1967	2022	Ⅰ																						
285	D-79橋	市道N-192号	3.1	6.7	1971	2020	Ⅰ																						
286	D-82橋	市道D-522号	4.5	5.2	1967	2022	Ⅰ																						
287	D-83橋	市道D-586号	3.8	4.0	1967	2022	Ⅰ																						
288	D-85橋	市道幹41号	4.5	15.0	1967	2020	Ⅰ																						
289	D-86橋	市道D-626号	5.4	4.5	1967	2021	Ⅰ																						
290	上唐沢橋	市道D-646号	5.1	4.5	1967	2022	Ⅰ																						
291	忠度橋	市道D-646号	3.6	4.6	1967	2022	Ⅰ																						
292	元西橋	市道D-650号	10.1	4.6	1986	2019	Ⅰ																						
293	元宮橋	市道D-560号	10.4	6.5	1954	2019	Ⅰ																						
294	みやさき橋	市道D-657号	10.1	5.7	1971	2019	Ⅰ																						
295	D-96橋	市道D-671号	2.7	4.0	1967	2022	Ⅰ																						
296	やすくに橋	市道D-030号	10.0	5.1	1961	2019	Ⅰ																						
297	太鼓橋	市道D-696号	12.5	4.6	1986	2019	Ⅰ																						
298	宮前橋	市道D-697号	13.5	6.2	1988	2019	Ⅰ																						
299	桜橋	市道幹4号	16.5	15.8	1986	2022	Ⅰ																						
300	内谷田橋	市道D-132号	25.3	4.6	1973	2022	Ⅱ	修繕										22,000										22,000	支承, 沓座, 下部工, 支承部, 伸縮装置
303	観月橋	市道D-704号	8.2	5.0	1996	2019	Ⅰ																						
304	D-110橋	市道D-702号	18.6	7.0	1984	2019	Ⅰ																						
305	新東橋1	市道幹35号	23.7	16.8	2004	2020	Ⅰ										修繕										15,900	15,900	伸縮装置
306	原新田橋	市道E-12号	30.0	6.2	1995	2019	Ⅰ																						
307	三ツ橋	市道幹24号	30.3	6.2	1992	2020	Ⅰ										修繕										8,800	8,800	伸縮装置
308	雁橋	市道E-21号	29.8	6.2	1990	2022	Ⅰ									修繕										5,500		5,500	主桁
309	原郷歩道橋	市道歩1号	110.0	3.5	1982	2019	Ⅱ																						
310	徳佐工門橋	市道E-398号	31.2	6.2	1982	2021	Ⅰ									修繕										5,700		5,700	主桁
313	八幡免橋	市道E-466号	33.8	6.2	1983	2021	Ⅰ									修繕										6,200		6,200	主桁
314	増田前橋	市道E-505号	33.8	5.2	1983	2021	Ⅰ																						
315	高名橋	市道幹32号	46.3	7.2	1983	2021	Ⅰ																						
317	E-17橋	市道幹32号	2.5	6.7	1956	2020	Ⅰ																						
319	E-26橋	市道E-448号	3.2	4.1	1956	2020	Ⅰ																						
320	E-27橋	市道E-446号	2.8	4.4	1956	2022	Ⅰ																						
321	E-29橋	市道E-449号	3.4	4.3	1956	2021	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
322	E-30橋	市道E-381号	2.6	4.0	1956	2022	Ⅰ																						
323	E-31橋	市道E-385号	2.6	9.1	1956	2022	Ⅰ																						
324	E-32橋	市道E-386号	2.6	4.0	1956	2022	Ⅰ																						
325	E-33橋	市道E-382号	2.6	12.0	1956	2021	Ⅰ																						
326	E-38橋	市道E-539号	3.6	3.0	1956	2020	Ⅰ																						
329	E-43橋	市道E-560号	3.6	3.0	1956	2020	Ⅰ																						
330	熊野橋	市道幹22号	30.0	6.2	1989	2020	Ⅱ						修繕										18,400					18,400	床版,伸縮装置
331	森下橋2	市道幹22号	2.3	5.1	1956	2020	Ⅰ																						
332	F-1橋	市道F-3号	18.6	3.8	1984	2019	Ⅰ																						
333	永徳屋橋	市道F-6号	16.1	6.6	1960	2021	Ⅱ			修繕										3,400								3,400	主桁, 床版
334	緑橋1	市道F-11号	7.7	5.5	1935	2019	Ⅱ							修繕										2,400				2,400	主桁, 床版
335	緑ヶ丘橋	市道F-34号	14.0	1.9	1981	2022	Ⅱ									修繕										3,900		3,900	支承部
336	下唐沢橋	市道幹39号	20.8	16.8	1979	2021	Ⅰ																						
337	金燈籠橋	市道F-92号	15.0	9.8	1978	2019	Ⅰ																						
338	F-7橋	市道F-67号	7.1	7.7	1967	2019	Ⅰ																						
339	F-8橋	市道幹39号	7.5	16.9	1979	2019	Ⅰ																						
340	F-9橋	市道歩4号	95.9	4.6	1982	2022	Ⅱ				修繕										15,800							15,800	主桁,下部工
341	御所ヶ谷戸橋	市道幹28号	8.9	11.0	2002	2019	Ⅰ																						
342	上野橋	市道幹28号	12.1	9.1	1977	2019	Ⅰ																						
343	G-1橋	市道G-62号	6.6	2.3	1956	2020	Ⅰ																						
344	G-3橋	市道G-2号	4.8	5.8	1956	2020	Ⅰ																						
345	G-4橋	市道幹45号	3.8	6.0	1956	2022	Ⅰ																						
346	G-5橋	市道G-16号	3.8	4.0	1956	2022	Ⅰ																						
347	G-6橋	市道G-5号	3.8	5.0	1956	2022	Ⅰ																						
348	G-7橋	市道幹46号	4.1	12.9	1956	2022	Ⅰ																						
349	大谷橋	市道幹11号	17.7	10.8	1984	2022	Ⅱ				修繕										19,600							19,600	主桁,下部工,支承部
350	下大谷橋	市道H-117号	10.0	6.0	1977	2019	Ⅰ																						
351	大黒橋	市道幹43号	14.0	8.2	2005	2019	Ⅰ																						
352	G-11橋	市道G-44号	3.0	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
353	G-12橋	市道G-43号	2.9	3.4	1956	2021	Ⅰ																						
354	G-13橋	市道幹46号	2.8	12.8	1956	2022	Ⅰ																						

【凡例】 ：点検　対策　：対策

橋梁諸元						直近の定期点検記録		点検・修繕時期と対策内容																									
								修繕計画										概算修繕金額(千円)															
No.	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	年度	判定区分	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	対策費(千円)	対策部材
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
355	G-14橋	市道G-45号	3.0	3.3	1956	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
356	G-15橋	市道G-46号	3.0	4.9	1956	2021	Ⅰ																						
357	G-17橋	市道G-53号	10.2	3.0	1956	2020	Ⅰ																						
358	G-18橋	市道G-47号	4.1	5.4	1956	2020	Ⅰ																						
359	G-19橋	市道幹2号	12.5	8.7	1956	2019	Ⅰ																						
360	G-20橋	市道G-53号	4.0	3.7	1956	2020	Ⅰ																						
361	G-22橋	市道G-91号	3.5	4.0	1956	2020	Ⅰ																						
362	G-25橋	市道G-67号	3.5	5.0	1956	2020	Ⅰ																						
363	G-26橋	市道幹2号	3.6	6.1	1956	2020	Ⅰ																						
364	G-34橋	市道G-124号	3.0	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
365	G-35橋	市道G-125号	3.0	3.3	1956	2020	Ⅰ																						
366	G-36橋	市道G-126号	2.9	4.9	1956	2021	Ⅰ																						
367	G-37橋	市道G-127号	3.0	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
368	G-38橋	市道G-128号	2.9	6.5	1956	2021	Ⅰ																						
369	G-39橋	市道G-129号	3.0	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
370	G-40橋	市道G-130号	3.0	5.9	1956	2021	Ⅰ																						
371	G-41橋	市道G-131号	2.9	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
372	G-42橋	市道G-132号	3.0	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
373	G-43橋	市道G-133号	2.9	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
374	G-68橋	市道幹45号	3.5	8.4	1956	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁
375	大橋橋	市道G-188号	11.5	5.7	1986	2019	Ⅰ																						
376	柳引一号橋	市道G-190号	11.4	6.7	1987	2019	Ⅰ																						
378	G-87橋	市道G-166号	2.7	3.3	1956	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
379	G-88橋	市道G-164号	2.7	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
380	G-89橋	市道G-162号	2.7	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
381	G-90橋	市道幹48号	2.7	6.6	1956	2020	Ⅰ																						
384	G-93橋	市道G-153号	2.8	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
385	G-94橋	市道G-152号	2.7	6.6	1956	2021	Ⅰ																						
386	G-95橋	市道G-151号	2.7	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
387	G-96橋	市道G-150号	2.7	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
391	G-107橋	市道G-191号	4.5	5.7	1956	2020	Ⅰ																						
392	G-112橋	市道G-210号	2.8	3.3	1956	2021	Ⅰ																						
393	G-113橋	市道幹9号	4.1	6.4	1956	2020	Ⅰ																						
394	G-114橋	市道G-186号	2.8	3.3	1956	2020	Ⅰ																						
395	G-116橋	市道幹45号	2.8	6.6	1956	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁
397	G-118橋	市道G-184号	2.8	3.3	1956	2020	Ⅰ																						
398	G-120橋	市道G-179号	2.8	3.3	1956	2020	Ⅰ																						
399	G-122橋	市道G-180号	2.8	3.3	1956	2020	Ⅰ																						
405	G-133橋	市道G-197号	2.7	6.7	1956	2021	Ⅰ																						
406	G-134橋	市道G-196号	3.6	4.3	1956	2020	Ⅰ																						
407	G-135橋	市道G-175号	5.3	8.7	1956	2019	Ⅰ																						
408	G-136橋	市道G-178号	5.3	4.7	1956	2020	Ⅰ																						
409	G-137橋	市道G-177号	5.3	4.7	1956	2020	Ⅰ																						
410	G-138橋	市道G-176号	5.3	4.7	1956	2020	Ⅰ																						
412	G-143橋	市道G-420号	2.5	6.1	1956	2022	Ⅰ																						
413	G-144橋	市道G-249号	2.5	6.1	1956	2022	Ⅰ																						
414	G-145橋	市道G-273号	2.7	6.0	1956	2022	Ⅰ																						
415	G-146橋	市道G-271号	3.1	6.0	1956	2022	Ⅰ																						
416	G-147橋	市道幹42号	5.5	6.4	1977	2020	Ⅱ				修繕										2,500							2,500	主桁, 支承部
417	G-148橋	市道G-302号	3.2	2.0	1977	2022	Ⅰ																						
418	G-149橋	市道G-319号	2.9	6.1	1977	2022	Ⅰ																						
419	G-150橋	市道G-304号	3.6	3.4	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
420	中通橋	市道幹50号	8.3	9.2	1993	2019	Ⅰ																						
421	G-152橋	市道G-317号	6.5	6.0	1993	2019	Ⅰ																						
422	G-153橋	市道G-310号	6.5	4.2	1993	2022	Ⅰ																						
423	G-154橋	市道G-316号	3.6	3.3	1993	2022	Ⅱ									修繕										1,100		1,100	主桁
424	G-155橋	市道G-314号	3.7	2.0	1993	2022	Ⅰ																						
425	泉橋	市道幹8号	7.4	11.0	1986	2019	Ⅰ																						
426	G-157橋	市道G-365号	5.1	3.4	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
427	G-158橋	市道G-372号	5.0	3.4	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
428	西原橋1	市道幹41号	7.4	11.1	1983	2019	Ⅰ																						
429	G-160橋	市道G-373号	5.0	3.4	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
430	吞沢橋	市道幹28号	10.5	10.2	1976	2019	Ⅰ																						
431	南唐沢橋	市道G-432号	6.3	4.7	1983	2022	Ⅰ																						
432	G-164橋	市道G-377号	3.0	3.9	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁,下部工
433	G-165橋	市道G-394号	5.7	4.2	1967	2021	Ⅰ																						
434	八幡橋	市道幹8号	8.4	11.0	1986	2019	Ⅰ																						
435	G-167橋	市道G-343号	8.7	4.0	1956	2020	Ⅰ																						
436	G-168橋	市道G-330号	4.0	5.1	1956	2022	Ⅰ																						
437	G-169橋	市道G-359号	5.3	3.0	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
438	G-170橋	市道G-362号	5.0	5.0	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
439	G-171橋	市道G-331号	2.9	10.1	1956	2022	Ⅰ																						
440	新田尻橋	市道幹50号	7.3	9.2	1956	2019	Ⅰ																						
441	G-173橋	市道G-332号	4.0	5.2	1977	2022	Ⅰ																						
442	G-174橋	市道G-339号	2.9	6.1	1977	2022	Ⅰ																						
443	G-175橋	市道幹42号	5.6	6.4	1977	2020	Ⅰ																						
444	G-176橋	市道G-262号	2.5	6.1	1977	2022	Ⅰ																						
445	G-177橋	市道幹41号	2.4	10.0	1977	2022	Ⅰ																						
447	G-214橋	市道G-343号	3.0	4.1	1956	2020	Ⅰ																						
448	G-215橋	市道G-357号	2.4	1.9	1956	2019	Ⅰ																						
449	新南橋	市道幹3号	8.0	17.9	2004	2019	Ⅰ																						
450	西川橋	市道幹3号	9.6	17.8	2004	2019	Ⅰ																						
451	H-2橋	市道H-124号	5.8	4.6	1993	2022	Ⅰ																						
452	H-3橋	市道H-91号	5.8	4.6	1993	2022	Ⅰ																						
453	H-4橋	市道H-92号	5.4	4.6	1993	2022	Ⅱ									修繕										1,100		1,100	主桁
454	H-5橋	市道H-95号	3.1	4.7	1993	2022	Ⅱ									修繕										1,100		1,100	主桁
455	H-6橋	市道H-93号	5.3	4.5	1993	2023	Ⅱ									修繕										1,100		1,100	主桁
456	H-7橋	市道H-110号	3.8	5.0	1993	2022	Ⅰ																						
457	H-8橋	市道H-105号	4.5	5.5	1993	2023	Ⅱ									修繕										1,100		1,100	主桁
458	H-9橋	市道H-105号	3.1	5.6	1993	2023	Ⅰ																						
459	H-10橋	市道H-155号	2.9	6.3	1993	2022	Ⅰ																						
460	谷畑橋	市道H-176号	8.5	5.7	1985	2019	Ⅰ																						
461	柳沢橋	市道H-182号	9.5	5.8	1979	2019	Ⅰ																						
462	H-13橋	市道H-314号	10.1	2.1	1956	2020	Ⅰ																						
463	H-14橋	市道H-167号	2.9	5.5	1956	2021	Ⅰ																						
464	H-15橋	市道H-185号	3.1	3.6	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
465	H-16橋	市道H-246号	3.8	5.5	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
466	H-17橋	市道H-231号	3.3	9.1	1956	2023	Ⅰ																						
467	H-18橋	市道H-193号	3.7	4.4	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
468	H-19橋	市道H-192号	2.8	10.0	1956	2022	Ⅰ																						
469	H-20橋	市道H-130号	3.4	5.8	1956	2022	Ⅰ																						
470	H-21橋	市道H-129号	3.5	12.4	1956	2022	Ⅰ																						
471	H-22橋	市道H-196号	4.1	4.4	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
472	H-23橋	市道H-192号	4.1	6.4	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
473	H-24橋	市道H-193号	4.1	6.6	1956	2022	Ⅰ																						
474	H-25橋	市道H-214号	3.2	6.3	1956	2022	Ⅰ																						
475	H-26橋	市道H-215号	3.7	4.4	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
476	H-27橋	市道H-195号	3.6	4.4	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
477	H-28橋	市道H-202号	4.3	5.9	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
478	H-29橋	市道H-222号	6.9	4.7	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	床版,下部工
479	H-30橋	市道H-224号	5.4	7.1	1956	2020	Ⅱ						修繕										1,400					1,400	主桁, 床版,下部工
480	H-31橋	市道H-205号	5.4	4.7	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	床版,下部工
481	H-32橋	市道H-203号	5.4	6.7	1956	2020	Ⅱ		修繕										1,300									1,300	主桁, 床版,下部工
482	H-33橋	市道H-204号	2.4	9.0	1956	2022	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁
483	H-34橋	市道H-224号	4.9	4.7	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
484	H-35橋	市道H-222号	4.9	4.7	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
486	H-38橋	市道H-263号	10.2	2.7	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,200				1,200	主桁,下部工
487	H-39橋	市道H-264号	10.2	2.7	1956	2020	Ⅱ						修繕										2,000					2,000	主桁, 床版,下部工
488	H-40橋	市道H-298号	13.6	4.7	1956	2019	Ⅰ										修繕										4,400	4,400	主桁, 床版,下部工
489	H-41橋	市道H-280号	3.3	4.4	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
490	H-42橋	市道H-299号	2.2	4.3	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
491	H-43橋	市道H-276号	2.4	9.6	1956	2022	Ⅰ																						
492	H-44橋	市道幹40号	5.2	31.0	1956	2023	Ⅰ																						
493	H-45橋	市道幹8号	6.8	6.6	1956	2019	Ⅰ																						
494	H-46橋	市道幹10号	6.3	9.6	1956	2019	Ⅱ				修繕										2,500							2,500	主桁
495	H-47橋	市道幹10号	3.6	8.1	1971	2020	Ⅱ		修繕										1,900									1,900	主桁,下部工
496	H-48橋	市道幹41号	5.9	9.5	1956	2019	Ⅱ				修繕										1,700							1,700	主桁
497	H-49橋	市道幹44号	2.9	10.8	1956	2022	Ⅰ																						
498	H-50橋	市道幹44号	3.7	8.9	1956	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁,下部工
499	H-51橋	市道幹11号	4.9	11.8	1956	2019	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	下部工
500	H-52橋	市道幹2号	3.5	8.8	1956	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁,下部工
501	H-53橋	市道幹42号	8.0	6.5	1956	2019	Ⅰ																						
503	H-55橋	市道H-275号	2.3	6.3	1956	2022	Ⅰ																						
505	I-1橋	市道I-2号	9.0	6.6	1993	2019	Ⅰ																						

【凡例】 ：点検　対策　：対策

橋梁諸元						直近の定期点検記録		点検・修繕時期と対策内容																											
								修繕計画												概算修繕金額(千円)															
No.	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	年度	判定区分	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	対策費(千円)	対策部材
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
506	I-2橋	市道I-1号	5.2	6.7	1993	2023	Ⅱ					修繕										1,100						1,100	下部工
507	南橋	市道幹3号	9.4	20.1	1978	2019	Ⅱ		修繕										3,100									3,100	下部工
508	I-4橋	市道I-72号	6.0	4.7	1977	2023	Ⅰ																						
509	I-5橋	市道幹42号	5.7	7.0	1977	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁,下部工
510	I-6橋	市道I-25号	6.0	6.7	1977	2023	Ⅰ																						
511	I-7橋	市道I-27号	5.7	4.5	1977	2023	Ⅰ																						
512	I-8橋	市道I-23号	6.0	4.7	1977	2023	Ⅰ																						
513	I-9橋	市道I-22号	6.3	4.7	1977	2023	Ⅰ																						
514	I-10橋	市道I-45号	7.5	3.2	1977	2023	Ⅱ								修繕										2,500			2,500	主桁,下部工,支承部
515	清水坂橋	市道幹5号	12.7	9.8	1977	2019	Ⅱ					修繕										3,700						3,700	主桁
516	坂下橋	市道幹3号	13.5	23.1	1978	2019	Ⅱ		修繕										4,100									4,100	下部工
517	I-13橋	市道I-104号	4.9	4.7	1977	2023	Ⅰ																						
518	I-14橋	市道I-117号	4.5	4.4	1977	2023	Ⅰ																						
519	I-15橋	市道幹43号	8.2	4.7	1977	2019	Ⅱ					修繕										1,100						1,100	床版
520	I-16橋	市道I-94号	7.1	4.7	1977	2023	Ⅰ																						
521	I-17橋	市道I-93号	8.2	8.8	1977	2019	Ⅰ																						
522	I-18橋	市道I-92号	6.8	6.7	1977	2019	Ⅰ																						
523	I-19橋	市道I-82号	7.5	6.8	1977	2019	Ⅰ																						
524	I-20橋	市道幹42号	10.5	6.7	1977	2019	Ⅰ										修繕										2,000	2,000	支承部
526	I-22橋	市道I-56号	10.4	6.8	1977	2019	Ⅰ																						
527	I-23橋	市道I-51号	12.2	6.7	1977	2019	Ⅰ																						
528	I-24橋	市道I-157号	10.4	4.7	1977	2019	Ⅰ																						
529	I-25橋	市道幹3号	6.3	23.4	1977	2019	Ⅱ		修繕										3,300									3,300	下部工
530	I-26橋	市道I-142号	3.9	4.7	1977	2020	Ⅱ							修繕											1,100			1,100	主桁,下部工
531	I-27橋	市道I-143号	3.9	4.7	1977	2021	Ⅰ																						
532	I-28橋	市道I-145号	3.8	6.9	1977	2023	Ⅰ																						
533	I-29橋	市道I-146号	3.8	6.8	1977	2023	Ⅰ																						
535	5-1号橋1	市道幹3号	3.9	12.6	1971	2019	Ⅰ																						
536	7-1号橋	市道幹61号	6.3	9.9	1966	2020	Ⅱ			修繕										2,000								2,000	床版,下部工
537	8-1号橋	市道幹55号	9.0	6.6	1970	2019	Ⅱ					修繕										3,100						3,100	床版
538	14-1号橋1	市道幹54号	6.6	8.7	1967	2019	Ⅰ																						
539	52-1号橋1	市道幹66号	2.3	9.0	1977	2022	Ⅰ																						
541	56-1号橋	市道幹70号	10.4	4.6	1969	2019	Ⅰ																						
542	57-1号橋	市道幹71号	12.8	6.8	1973	2019	Ⅰ																						
543	61-1号橋	市道幹75号	3.8	6.5	1971	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁,下部工
544	62-1号橋	市道幹75号	2.0	6.1	1968	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁,下部工
545	65-1号橋	市道幹78号	10.5	6.6	1975	2019	Ⅰ																						
546	66-1号橋1	市道幹79号	3.0	7.5	1967	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁,下部工
547	72-1号橋	市道幹84号	8.3	5.6	1975	2019	Ⅱ					修繕										2,400						2,400	床版
549	1-153-1号橋	市道J-153号	5.0	2.7	1956	2020	Ⅰ																						
551	1-165-1号橋	市道J-165号	3.5	5.5	2017	2021	Ⅰ																						
554	1-244-1号橋	市道J-244号	2.0	4.6	1956	2021	Ⅰ																						
555	1-245-1号橋	市道J-245号	2.0	5.7	1956	2021	Ⅰ																						
556	1-246-1号橋	市道J-246号	2.5	6.0	1956	2023	Ⅰ																						
557	1-288-1号橋	市道J-288号	11.1	4.6	1975	2019	Ⅰ																						
558	1-299-1号橋	市道J-299号	11.1	4.6	1975	2019	Ⅰ																						
559	1-308-1号橋	市道J-308号	11.1	3.2	1975	2023	Ⅰ																						
560	1-310-1号橋	市道J-704号	11.0	4.6	1975	2019	Ⅰ																						
561	1-461-1号橋	市道J-461号	6.3	6.2	1977	2023	Ⅰ																						
562	1-469-1号橋	市道J-469号	4.2	4.5	1987	2023	Ⅰ																						
563	1-500-1号橋	市道J-500号	11.5	4.7	1975	2019	Ⅰ																						
566	1-577-1号橋	市道J-577号	2.9	5.0	2018	2021	Ⅰ																						
569	2-114-1号橋	市道M-114号	2.3	6.2	1977	2022	Ⅰ																						
570	2-116-1号橋1	市道M-116号	2.3	7.5	1977	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
571	2-155-1号橋	市道M-155号	2.3	5.0	1977	2022	Ⅰ																						
572	2-190-1号橋	市道M-190号	11.3	4.6	1975	2019	Ⅰ																						
573	2-191-1号橋	市道M-191号	11.5	4.6	1975	2019	Ⅰ																						
574	2-254-1号橋	市道M-254号	2.4	4.2	1956	2021	Ⅰ																						
575	2-262-1号橋	市道M-262号	11.2	4.6	1975	2019	Ⅰ																						
576	2-263-1号橋	市道M-263号	11.5	5.7	1975	2019	Ⅰ																						
577	2-266-1号橋	市道M-266号	9.0	4.6	1975	2023	Ⅰ																						
578	2-268-1号橋	市道M-268号	3.0	4.6	1968	2023	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
579	2-269-1号橋	市道M-269号	9.4	4.6	1975	2023	Ⅰ																						
580	2-270-1号橋	市道M-270号	9.7	4.7	1975	2019	Ⅰ																						
581	2-275-1号橋	市道M-275号	2.6	4.4	1956	2021	Ⅰ																						
582	2-324-1号橋	市道M-324号	5.8	4.1	1956	2020	Ⅱ						修繕										1,100					1,100	主桁, 床版,下部工
583	2-364-1号橋	市道M-364号	2.1	6.8	1956	2021	Ⅰ																						
584	2-367-1号橋	市道M-367号	2.2	4.8	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
585	2-370-1号橋	市道M-370号	2.4	4.8	1956	2021	Ⅰ																						
586	2-377-1号橋	市道M-377号	2.1	5.8	1956	2021	Ⅰ																						
587	2-378-1号橋	市道M-378号	2.1	4.8	1956	2021	Ⅰ																						
588	2-380-1号橋	市道M-380号	13.0	4.8	1985	2019	Ⅰ																						
589	2-390-1号橋	市道M-390号	13.0	5.2	1975	2019	Ⅰ																						
590	2-401-1号橋	市道M-401号	3.7	5.3	1956	2020	Ⅱ							修繕											1,100			1,100	下部工
591	2-411-1号橋	市道M-411号	3.6	5.5	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
592	2-412-1号橋	市道M-412号	3.5	4.4	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
594	2-499-1号橋	市道M-499号	11.4	6.6	1975	2019	Ⅰ																						
595	2-513-1号橋	市道M-513号	2.2	5.5	1956	2021	Ⅰ																						
596	2-513-2号橋	市道M-513号	11.5	5.6	1975	2019	Ⅰ																						
597	2-523-1号橋	市道M-523号	10.4	4.6	1975	2019	Ⅰ																						
598	2-527-1号橋	市道M-527号	10.4	5.6	1975	2019	Ⅰ																						
599	3-149-1号橋	市道N-149号	2.6	6.4	1971	2023	Ⅰ																						
600	3-155-1号橋	市道N-155号	3.4	4.7	1972	2023	Ⅰ																						
601	3-160-1号橋1	市道N-160号	3.4	4.7	1972	2023	Ⅰ																						
602	3-171-1号橋	市道N-171号	2.8	5.4	1971	2023	Ⅰ																						
603	3-173-1号橋	市道N-173号	3.8	4.0	1971	2023	Ⅰ																						
604	3-185-1号橋	市道N-185号	2.8	3.4	1971	2023	Ⅰ																						
605	3-186-1号橋	市道N-186号	3.2	3.4	1971	2023	Ⅰ																						
607	3-219-1号橋	市道N-219号	2.2	4.6	1956	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
608	3-230-1号橋	市道N-230号	2.2	4.6	1956	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
609	3-231-1号橋	市道N-231号	2.2	6.6	1956	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
610	3-236-1号橋	市道N-236号	2.0	6.2	1968	2023	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
611	3-239-1号橋	市道N-239号	2.0	4.6	1968	2023	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
612	3-252-1号橋	市道N-252号	8.2	4.6	1970	2023	Ⅰ																						
613	3-257-1号橋	市道N-257号	14.4	4.7	1975	2019	Ⅰ																						
614	3-259-1号橋	市道N-259号	7.5	4.6	1975	2023	Ⅰ																						
615	3-260-1号橋1	市道N-260号	7.4	5.6	1975	2023	Ⅰ																						
616	3-261-1号橋	市道N-261号	13.3	4.7	1975	2019	Ⅱ									修繕										1,700		1,700	床版
617	3-262-1号橋	市道N-262号	7.4	4.6	1975	2023	Ⅰ																						
618	3-278-1号橋	市道N-278号	3.4	4.6	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
619	3-277-1号橋	市道N-277号	3.4	4.3	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁,下部工
620	3-279-1号橋	市道N-279号	3.0	4.4	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	床版,下部工
621	3-280-1号橋	市道N-280号	3.5	4.3	1956	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
622	3-290-1号橋	市道N-290号	5.6	6.7	1975	2023	Ⅰ																						
623	3-314-1号橋	市道N-314号	2.7	4.3	1956	2021	Ⅰ																						
624	3-320-1号橋	市道N-320号	2.7	4.3	1956	2021	Ⅰ																						
625	3-326-1号橋	市道N-326号	2.7	4.3	1956	2021	Ⅰ																						
628	3-401-1号橋	市道N-401号	5.3	6.7	1956	2020	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	床版,下部工
629	3-401-2号橋	市道N-401号	2.3	5.1	1956	2020	Ⅰ																						
631	3-407-1号橋	市道N-407号	2.7	5.5	1956	2022	Ⅰ																						
632	3-408-1号橋	市道N-408号	2.7	5.5	1956	2022	Ⅰ																						
633	3-409-1号橋	市道幹48号	2.3	6.4	1956	2020	Ⅱ		修繕										1,100									1,100	主桁, 床版,下部工
634	3-410-1号橋	市道N-410号	2.7	5.5	1956	2022	Ⅰ																						
636	山宝橋	市道N-450号	10.4	8.2	1987	2023	Ⅰ																						
637	3-473-1号橋	市道N-473号	3.3	4.7	1972	2023	Ⅰ																						
638	3-486-1号橋	市道N-486号	2.7	5.5	1972	2022	Ⅰ																						
639	3-487-1号橋	市道N-487号	2.6	5.5	1972	2022	Ⅰ																						
641	3-495-1号橋	市道N-495号	3.4	10.8	1972	2023	Ⅰ																						
642	3-3068-1号橋	市道N-3068号	7.0	3.6	1975	2023	Ⅰ																						
643	3-3070-1号橋	市道N-3070号	6.8	3.4	1975	2023	Ⅰ																						
644	滝岡橋	市道幹58号	73.5	7.0	1932	2021	Ⅱ										修繕										17,700	17,700	主桁,下部工
645	山和橋	市道幹55号	18.6	7.8	1975	2022	Ⅱ				修繕										9,000							9,000	床版,下部工
646	藤治川橋	市道幹62号	23.4	7.7	1983	2020	Ⅰ																						
647	藤治川側道橋	市道幹62号	23.8	3.3	1989	2020	Ⅰ																						
648	和倉橋	市道幹55号	44.2	7.7	1981	2020	Ⅱ						修繕										24,800					24,800	床版,伸縮装置
649	かみはら陸橋	市道幹54号	167.9	9.8	1979	2023	Ⅱ			修繕										36,900								36,900	主桁, 床版,下部工
650	榛吝橋	市道幹69号	55.5	8.2	1997	2020	Ⅱ						修繕										13,500					13,500	主桁
651	西谷橋	市道幹80号	15.7	7.0	1978	2019	Ⅰ																						
652	龍ヶ谷橋	市道幹3号	17.0	12.0	1969	2019	Ⅰ										修繕										25,000	25,000	主桁,床版,下部工,伸縮装置
653	岡部上橋	市道J-233号	19.5	6.2	1997	2020	Ⅰ																						
654	岡部中橋	市道J-234号	19.2	6.2	2000	2021	Ⅰ																						
655	岡部下橋	市道J-235号	19.2	6.2	2000	2022	Ⅰ																						
656	福川橋	市道J-584号	19.8	6.2	1998	2020	Ⅰ																						
657	普済寺上橋	市道J-585号	19.7	6.2	2000	2022	Ⅰ																						

【凡例】 ：点検　対策　：対策

橋梁諸元						直近の定期点検記録		点検・修繕時期と対策内容																							
								修繕計画										概算修繕金額(千円)													
No.	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	年度	判定区分	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	対策費(千円)	対策部材
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
658	普済寺下橋	市道J-588号	19.7	6.2	1998	2022	Ⅰ																						
660	長作橋	市道M-364号	17.6	6.2	1984	2022	Ⅰ																						
661	原野橋	市道M-537号	22.5	11.8	1998	2022	Ⅰ																						
662	新栗橋2	市道M-545号	45.8	4.7	1976	2020	Ⅱ		修繕										14,100									14,100	床版, 下部工, 支承部
663	中里橋	市道幹100号	10.2	7.2	2006	2021	Ⅰ																						
664	A-2橋2	市道幹101号	8.6	7.9	1977	2020	Ⅱ				修繕										4,700							4,700	床版, 下部工
667	A-5橋2	市道P-19号	3.6	4.4	1967	2021	Ⅰ																						
669	A-7橋	市道P-37号	3.6	4.4	1967	2021	Ⅰ																						
672	A-10橋	市道P-61号	2.7	3.3	1967	2022	Ⅰ																						
673	A-11橋	市道P-62号	2.7	3.4	1967	2022	Ⅰ																						
674	A-12橋	市道P-63号	10.1	3.0	1967	2021	Ⅱ							修繕										2,200				2,200	主桁, 床版, 下部工
675	A-13橋	市道P-74号	6.5	2.6	1967	2021	Ⅲ				修繕										2,200							2,200	主桁, 床版
676	A-14橋	市道P-99号	8.7	4.7	1966	2019	Ⅰ																						
677	A-15橋	市道P-114号	8.7	5.1	1966	2019	Ⅰ																						
678	A-16橋	市道P-116号	3.5	4.6	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁, 下部工
679	A-17橋	市道幹100号	3.5	5.5	1967	2021	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
680	切比羅橋	市道P-125号	5.5	6.7	1967	2022	Ⅱ							修繕										2,000				2,000	主桁, 下部工
681	A-19橋	市道P-135号	4.3	4.7	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
682	A-20橋	市道P-144号	7.2	2.3	1967	2021	Ⅰ																						
683	A-21橋2	市道P-145号	7.2	2.3	1967	2021	Ⅰ																						
684	A-22橋	市道P-151号	6.8	2.3	1967	2021	Ⅰ																						
685	A-23橋	市道P-183号	2.8	4.5	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁, 下部工
686	A-24橋	市道P-167号	3.1	4.5	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁, 下部工
687	A-25橋	市道P-218号	4.3	3.5	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁, 下部工
688	B-1橋	市道Q-16号	2.7	9.6	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
689	B-2橋	市道Q-17号	2.6	6.4	1967	2022	Ⅰ																						
690	B-3橋	市道Q-20号	3.0	6.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
691	B-4橋	市道Q-37号	3.0	8.0	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
692	B-5橋	市道Q-13号	3.0	8.0	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
693	B-6橋	市道Q-15号	3.0	8.0	1967	2022	Ⅰ																						
695	B-9橋2	市道Q-11号	3.0	5.0	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
696	B-10橋2	市道Q-12号	3.0	5.0	1967	2022	Ⅰ																						
697	B-11橋2	市道Q-92号	2.8	8.1	1967	2023	Ⅰ																						
698	B-12橋2	市道Q-11号	3.9	4.7	1967	2022	Ⅱ																						
699	B-13橋2	市道Q-122号	3.9	4.7	1967	2022	Ⅰ																						
700	B-14橋	市道Q-810号	3.9	4.7	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
701	B-15橋2	市道Q-12号	3.9	4.7	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁, 下部工
702	B-16橋2	市道Q-810号	3.9	4.7	1967	2020	Ⅰ																						
703	B-17橋2	市道Q-810号	6.3	4.7	1967	2020	Ⅱ						修繕										1,100					1,100	主桁, 床版, 下部工
704	B-18橋2	市道幹89号	8.5	7.7	1966	2021	Ⅰ																						
705	B-19橋2	市道幹102号	4.7	6.6	1967	2020	Ⅱ		修繕										2,600									2,600	主桁, 床版, 下部工
706	B-20橋2	市道Q-130号	8.9	4.7	1966	2023	Ⅰ																						
707	B-21橋	市道Q-125号	5.0	12.4	1966	2023	Ⅰ																						
708	B-22橋	市道Q-124号	10.5	4.7	1966	2019	Ⅰ																						
709	B-23橋2	市道Q-17号	3.8	4.7	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
710	B-24橋2	市道Q-20号	3.8	4.7	1967	2022	Ⅰ																						
711	B-26橋2	市道Q-176号	4.9	7.7	1966	2023	Ⅰ																						
714	B-30橋	市道Q-567号	4.9	4.6	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
715	B-31橋	市道Q-569号	4.8	4.6	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
716	B-32橋	市道Q-639号	4.8	5.6	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,800								1,800	床版, 下部工
719	B-36橋	市道Q-122号	3.8	4.7	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
720	2-38号橋	市道幹89号	26.2	6.5	1976	2019	Ⅱ																						
721	2-39号橋	市道幹90号	25.1	12.1	1976	2019	Ⅱ																						
722	北無名52号橋	市道Q-177号	34.0	3.6	1976	2019	Ⅱ																						
731	天神橋	市道Q-521号	14.9	2.8	1934	2020	Ⅱ						修繕										2,900					2,900	主桁, 床版, 下部工
732	B-58橋	市道Q-521号	3.9	4.1	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁, 下部工
733	B-59橋	市道Q-517号	7.3	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
734	B-60橋	市道Q-510号	8.3	3.6	1967	2021	Ⅰ																						
735	B-61橋	市道Q-520号	7.2	3.5	1967	2021	Ⅰ																						
736	B-64橋	市道Q-730号	2.3	6.1	1967	2023	Ⅰ																						
737	B-65橋2	市道Q-734号	3.3	9.0	1967	2023	Ⅰ																						
738	B-66橋2	市道幹106号	2.3	9.0	1967	2023	Ⅰ																						
740	C-2橋	市道幹91号	4.5	6.4	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
741	C-3橋2	市道R-178号	3.3	4.4	1967	2022	Ⅱ																						
742	C-4橋	市道R-194号	3.2	4.4	1967	2022	Ⅰ																						
743	C-5橋	市道R-259号	3.5	4.4	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100				1,100	主桁, 下部工
745	C-7橋	市道R-265号	3.2	5.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
746	C-9橋	市道R-263号	3.3	4.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
747	C-10橋	市道R-297号	11.4	3.4	1966	2019	Ⅰ										修繕										2,700	2,700	主桁, 床版, 下部工
748	赤木橋	市道R-296号	11.5	7.6	1966	2019	Ⅰ										修繕										6,200	6,200	主桁, 床版, 下部工
750	重忠橋	市道幹46号	236.0	10.5	2003	2020	Ⅱ					修繕	修繕	修繕								25,000	25,000	33,100				83,100	主桁, 床版, 伸縮装置
752	D-2橋2	市道S-205号	4.0	4.0	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
753	D-3橋2	市道S-183号	3.5	5.0	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
754	D-4橋2	市道S-177号	3.5	5.0	1967	2020	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁, 下部工
755	D-5橋	市道幹97号	2.5	4.0	1967	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁, 下部工
756	D-6橋	市道幹113号	3.9	6.0	1967	2023	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
757	D-7橋2	市道S-169号	2.9	4.0	2009	2023	Ⅰ																						
758	D-8橋	市道幹112号	3.2	5.0	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
759	D-9橋	市道S-24号	2.9	4.5	1967	2023	Ⅰ																						
760	落合橋	市道幹112号	25.2	5.2	1969	2019	Ⅱ				修繕										8,900							8,900	床版, 支承部
761	D-11橋	市道S-259号	12.9	3.7	1967	2019	Ⅰ																						
762	白草橋	市道幹94号	12.9	5.7	1967	2019	Ⅰ								修繕											5,100		5,100	主桁, 床版, 下部工
763	D-13橋	市道S-410号	13.0	3.6	1967	2019	Ⅰ																						
764	D-14橋2	市道幹118号	13.0	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
765	芳沼第二橋	市道S-456号	17.5	3.8	1970	2020	Ⅱ					修繕										3,400						3,400	床版
766	D-16橋	市道S-468号	12.9	3.6	1967	2019	Ⅰ								修繕											3,300		3,300	主桁, 床版, 下部工
767	D-17橋	市道幹116号	2.3	6.0	1967	2023	Ⅰ																						
768	D-18橋2	市道S-249号	2.3	6.0	1967	2023	Ⅰ																						
769	D-19橋2	市道S-161号	2.7	23.5	1967	2023	Ⅰ																						
770	内田橋	市道S-236号	28.5	3.3	1992	2022	Ⅰ																						
771	3-1号橋	市道幹124号	7.7	12.7	1967	2019	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	下部工
772	3-2号橋	市道幹124号	4.3	10.2	1967	2019	Ⅰ																						
773	3-3号橋	市道幹124号	3.7	9.4	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
774	4-1号橋	市道幹125号	9.1	7.2	1963	2019	Ⅰ																						
775	4-2号橋	市道幹125号	4.1	6.9	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
776	5-1号橋2	市道幹2号	8.4	8.3	1967	2020	Ⅱ			修繕										2,200								2,200	床版, 下部工
777	中原橋	市道幹138線	3.9	5.6	1963	2020	Ⅱ			修繕										1,400								1,400	主桁, 下部工
778	平成橋	市道幹127号	8.9	7.2	1989	2019	Ⅰ								修繕											1,100		1,100	下部工
779	10-1号橋	市道幹130号	7.8	8.8	1967	2019	Ⅰ																						
780	12-1号橋	市道幹132号	5.0	9.5	1963	2019	Ⅰ																						
783	14-1号橋2	市道幹134号	7.3	6.7	1963	2019	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	下部工
784	14-2号橋	市道幹134号	3.7	7.9	1998	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁, 下部工
785	24-1号橋	市道幹46号	3.9	15.6	1998	2023	Ⅱ					修繕											1,100					1,100	主桁
786	蟹沢橋	市道幹47号	10.4	6.4	1967	2019	Ⅰ																						
787	澤池橋	市道幹47号	5.4	8.2	1965	2019	Ⅰ																						
788	緑橋2	市道幹47号	2.6	7.9	1965	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
789	52-1号橋2	市道幹142号	4.2	5.5	1967	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	下部工
790	53-1号橋	市道幹143号	2.6	5.4	1967	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁, 下部工
791	54-1号橋2	市道幹144号	4.5	5.6	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
792	55-1号橋	市道幹145号	9.2	5.7	1963	2019	Ⅰ								修繕											1,900		1,900	主桁, 床版, 下部工
793	白鷺橋	市道幹146号	10.3	13.0	1989	2019	Ⅰ								修繕											1,100		1,100	下部工
794	大久保橋	市道幹147号	9.0	7.2	1989	2019	Ⅰ																						
795	59-1号橋	市道幹149号	5.1	4.7	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
796	59-2号橋	市道幹149号	3.4	6.0	1967	2023	Ⅰ																						
797	59-3号橋	市道幹149号	4.5	5.6	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
801	67-1号橋	市道幹153号	2.7	5.8	1967	2020	Ⅱ				修繕										1,100							1,100	主桁, 下部工
802	68-1号橋	市道幹154号	3.1	5.8	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
803	69-1号橋	市道幹155号	3.0	5.2	1967	2020	Ⅱ					修繕										1,100						1,100	下部工
804	70-1号橋	市道幹156号	5.5	5.9	1967	2020	Ⅱ			修繕										1,100								1,100	主桁, 下部工
806	1-101-1号橋	市道T-101号	2.8	4.6	1967	2022	Ⅰ																						
807	1-101-2号橋	市道T-101号	3.4	4.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁, 下部工
809	1-103-1号橋	市道T-103号	2.1	5.6	1967	2023	Ⅰ																						
810	1-104-1号橋	市道T-104号	7.4	3.7	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
811	1-104-2号橋	市道T-104号	2.5	4.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
812	1-105-1号橋	市道T-105号	3.7	4.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
813	1-105-2号橋	市道T-105号	6.4	4.5	1967	2021	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
814	1-106-1号橋	市道T-106号	2.5	4.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
815	1-107-1号橋	市道T-107号	2.6	4.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁, 下部工
816	1-108-1号橋	市道T-108号	4.5	3.5	1967	2022	Ⅰ																						
817	1-112-1号橋	市道T-112号	2.4	4.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	下部工
818	1-113-1号橋	市道T-113号	2.6	4.4	1967	2022	Ⅱ																						
819	1-114-1号橋	市道T-114号	2.6	4.4	1967	2022	Ⅱ								修繕										1,100			1,100	主桁
820	1-115-1号橋	市道T-115号	2.6	5.9	1967	2023	Ⅰ																						
821	上宿橋	市道T-123号	7.3	5.8	1967	2021	Ⅰ																						

【凡例】 ：点検　対策　：対策

橋梁諸元						直近の定期点検記録		点検・修繕時期と対策内容																											
								修繕計画											概算修繕金額(千円)																
No.	橋梁名称	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	年度	判定区分	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	対策費(千円)	対策部材
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
822	1-123-2号橋	市道T-123号	2.4	8.7	1967	2023	Ⅰ																						
823	1-140-1号橋	市道T-140号	6.2	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
824	1-144-1号橋	市道T-144号	9.0	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
825	1-147-1号橋	市道T-147号	2.1	3.5	1967	2022	Ⅰ																						
826	1-151-1号橋	市道T-151号	3.8	5.5	1967	2022	Ⅰ																						
827	1-151-2号橋	市道T-151号	3.8	5.6	1967	2022	Ⅱ																						
828	1-152-1号橋	市道T-152号	4.4	4.4	1967	2021	Ⅰ																						
829	1-159-1号橋	市道T-159号	4.1	5.5	1967	2022	Ⅱ																						
830	1-159-2号橋	市道T-159号	3.9	5.6	1967	2022	Ⅱ																						
831	1-160-1号橋	市道T-160号	2.7	2.1	1967	2019	Ⅰ																						
832	1-161-1号橋	市道T-161号	3.2	5.5	1967	2022	Ⅰ																						
833	1-175-1号橋	市道T-175号	3.7	5.1	1967	2020	Ⅱ					修繕										3,000					3,000	主桁,床版,下部工,支承部
834	1-175-2号橋	市道T-175号	3.4	4.5	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	下部工
836	1-192-1号橋2	市道T-192号	2.7	5.0	1967	2022	Ⅰ																						
838	1-250-1号橋	市道T-250号	17.6	3.6	1969	2019	Ⅰ										修繕										11,600	11,600	主桁, 床版, 下部工, 支承部, 橋脚躯体
841	魚住橋	市道T-294号	3.7	6.6	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	主桁
842	2-108-1号橋	市道U-108号	2.6	4.4	1967	2022	Ⅰ																						
843	2-116-1号橋2	市道U-116号	3.0	4.5	1967	2022	Ⅱ																						
844	2-118-1号橋	市道U-118号	3.0	5.3	1967	2022	Ⅰ																						
845	2-118-2号橋	市道U-118号	3.0	4.2	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	下部工
846	2-120-1号橋	市道U-120号	5.5	5.9	1967	2021	Ⅰ																						
847	2-120-2号橋	市道U-120号	5.2	5.1	1967	2021	Ⅰ																						
848	2-121-1号橋	市道U-121号	2.7	4.5	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	下部工
849	2-135-1号橋	市道U-135号	3.0	4.4	1967	2022	Ⅱ																						
850	2-144-1号橋	市道U-144号	6.3	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
851	2-150-1号橋	市道U-150号	3.0	4.4	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	下部工
852	2-156-1号橋	市道U-156号	3.3	4.4	1967	2022	Ⅱ																						
854	2-193-1号橋	市道U-193号	3.7	9.8	1967	2020	Ⅱ						修繕											1,100			1,100	主桁,下部工
855	2-206-1号橋	市道U-206号	12.0	5.7	1967	2019	Ⅱ						修繕											3,900			3,900	主桁, 床版
856	植松橋	市道U-213号	6.7	6.2	1988	2023	Ⅰ																						
857	2-213-2号橋	市道U-213号	3.7	8.0	1988	2023	Ⅱ									修繕										1,100	1,100	主桁
858	西原橋2	市道U-214号	3.9	5.6	1963	2020	Ⅱ						修繕											1,400			1,400	主桁,下部工
859	2-215-1号橋	市道U-215号	3.5	2.4	1967	2023	Ⅰ																						
860	2-216-1号橋	市道U-216号	3.8	3.6	1967	2023	Ⅰ																						
861	2-216-2号橋	市道U-216号	7.8	3.6	1963	2020	Ⅱ						修繕											1,400			1,400	主桁,下部工
862	西原上橋	市道U-228号	7.4	2.4	1963	2020	Ⅱ					修繕											1,300				1,300	主桁, 床版, 下部工
863	2-230-1号橋	市道U-230号	8.5	2.0	1967	2020	Ⅱ						修繕											2,200			2,200	主桁,床版,下部工,支承部
864	豊戸橋	市道U-243号	9.0	5.2	1992	2023	Ⅰ																						
866	水久保橋	市道U-253号	8.5	5.2	1967	2021	Ⅰ																						
867	2-257-1号橋	市道U-257号	7.8	4.6	1967	2021	Ⅰ																						
868	2-258-1号橋	市道U-258号	9.4	4.8	1963	2019	Ⅰ																						
869	福橋	市道U-259号	6.6	5.6	1967	2021	Ⅰ																						
870	寿橋	市道U-260号	9.4	6.2	1993	2019	Ⅰ																						
871	2-282-1号橋	市道U-282号	3.9	8.1	1993	2023	Ⅰ																						
872	2-285-1号橋	市道U-285号	3.8	4.2	1967	2022	Ⅰ																						
873	2-286-1号橋	市道U-286号	3.8	4.4	1967	2021	Ⅰ																						
877	2-327-1号橋	市道U-327号	5.1	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
878	2-328-1号橋	市道U-328号	5.0	4.7	1967	2022	Ⅱ																						
879	2-329-1号橋	市道U-329号	3.4	6.9	1967	2023	Ⅰ																						
880	2-332-1号橋	市道U-332号	3.2	4.4	1967	2022	Ⅰ																						
881	2-334-1号橋	市道U-334号	3.2	2.3	1967	2019	Ⅰ																						
882	2-349-1号橋	市道U-349号	5.0	4.7	1967	2021	Ⅰ																						
883	2-350-1号橋	市道U-350号	7.1	8.3	1967	2023	Ⅰ																						
884	台橋	市道U-521号	8.6	6.7	1967	2019	Ⅰ																						
885	3-109-1号橋	市道幹43号	2.9	4.9	1967	2020	Ⅱ					修繕										1,100					1,100	主桁
886	3-110-1号橋	市道V-110号	2.7	3.3	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	主桁
887	3-111-1号橋	市道V-111号	3.0	4.9	1967	2022	Ⅰ																						
888	3-112-1号橋	市道V-112号	3.0	3.3	1967	2022	Ⅰ																						
889	3-122-1号橋	市道V-122号	4.3	4.4	1967	2022	Ⅱ																						
890	3-125-1号橋	市道V-125号	3.0	4.4	1967	2022	Ⅰ																						
891	3-130-1号橋	市道V-130号	2.5	4.4	1967	2022	Ⅰ																						
892	3-131-1号橋	市道V-131号	2.6	4.4	1967	2022	Ⅰ																						
893	3-132-1号橋	市道V-132号	3.1	4.4	1967	2022	Ⅱ																						
895	3-136-1号橋	市道V-136号	3.5	4.4	1967	2022	Ⅱ																						
896	3-137-1号橋	市道V-137号	4.1	4.4	1967	2022	Ⅰ																						
897	3-140-1号橋	市道V-140号	3.9	5.7	1967	2022	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	主桁
900	3-160-1号橋2	市道V-160号	5.6	12.0	2021	2023	Ⅰ																						
901	3-183-1号橋	市道V-183号	5.0	4.9	1967	2020	Ⅱ						修繕											2,000			2,000	主桁, 床版, 下部工
902	3-215-1号橋	市道V-215号	4.2	3.0	1967	2022	Ⅰ																						
903	3-220-1号橋	市道V-220号	4.2	3.1	1967	2021	Ⅰ																						
904	3-221-1号橋	市道V-221号	10.5	5.8	1963	2019	Ⅰ																						
905	下反橋	市道V-223号	9.8	5.2	1992	2019	Ⅰ																						
906	3-256-1号橋	市道V-256号	4.5	3.7	1967	2022	Ⅱ																						
907	3-303-1号橋	市道V-303号	4.7	4.0	1967	2022	Ⅱ																						
908	3-304-1号橋	市道V-304号	5.0	5.4	1967	2022	Ⅱ																						
911	小山川橋	市道O-387号	160.5	5.2	1986	2020	Ⅱ		修繕										24,700								24,700	主桁
912	西丘橋	市道J-310号	10.5	15.4	2005	2023	Ⅰ																						
913	A-220橋	市道A-926号	2.6	6.0	1967	2023	Ⅰ																						
914	C-95橋	市道C-364号	2.6	5.0	1967	2023	Ⅰ																						
915	智形橋側道橋	市道D-155号	24.7	3.3	1975	2022	Ⅱ						修繕										1,400				1,400	支承部
916	同269-1号橋側道橋	市道M-269号	9.5	3.3	2010	2023	Ⅰ																						
917	B-32橋側道橋	市道Q-639号	6.0	2.6	1967	2020	Ⅱ						修繕											1,100			1,100	主桁,下部工
918	5-1号橋2側道橋	市道幹2号	7.9	2.0	1972	2020	Ⅱ			修繕										2,000							2,000	主桁,床版,下部工,支承部
919	本郷橋	市道幹158号	19.0	11.0	2017	2022	Ⅰ																						
920	無名橋1	市道P-18号	3.6	6.6	1972	2018	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	主桁,下部工
921	T-1橋	市道幹144号	2.9	6.6	1972	2023	Ⅰ																						
922	P-1橋	市道P-8号	3.6	5.4	1972	2023	Ⅰ																						
923	P-3橋	市道P-132号	3.5	4.5	1972	2023	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	主桁,下部工
924	P-4橋	市道P-119号	3.6	4.6	1972	2023	Ⅱ							修繕										1,100			1,100	主桁,下部工
925	J-1橋	市道幹58号	5.0	10.0	1972	2023	Ⅰ																						
926	J-2橋	市道J-164号	2.0	18.1	1972	2023	Ⅰ																						
927	A-281橋	市道A-332号	3.0	6.8	2014	2023	Ⅰ																						
928	B-108橋	市道B-283号	5.8	4.2	1972	2023	Ⅰ																						
929	A-282橋	市道A-289号	2.3	5.0	2015	2023	Ⅰ																						
930	A-283橋	市道A-290号	2.3	5.0	2015	2023	Ⅰ																						
931	A-284橋	市道A-291号	2.3	5.0	2015	2023	Ⅰ																						
932	A-285橋	市道A-292号	2.3	5.0	2014	2023	Ⅰ																						
933	A-286橋	市道A-293号	2.3	6.0	2014	2023	Ⅰ																						
934	A-116橋	市道A-66号	2.4	6.5	2015	2023	Ⅰ																						
935	A-117橋	市道A-75号	2.4	6.1	2015	2023	Ⅰ																						
936	A-277橋	市道A-256号	2.3	5.0	2014	2023	Ⅰ																						
937	A-278橋	市道A-295号	2.3	8.0	2013	2023	Ⅰ																						
938	A-279橋	市道A-66号	2.3	8.5	2017	2023	Ⅰ																						
939	A-280橋	市道A-73号	2.4	5.0	2015	2023	Ⅰ																						
940	A-217橋	市道A-954号	2.6	6.1	1972	2023	Ⅰ																						
941	C-114橋	市道C-619号	3.2	4.5	1972	2023	Ⅰ																						
942	C-117橋	市道C-757号	2.2	5.9	1972	2023	Ⅰ																						
943	D-74橋	市道D-508号	2.5	8.0	1972	2023	Ⅰ																						
944	D-112橋	市道D-15号	2.7	3.8	1972	2023	Ⅰ																						
945	J-3橋	市道J-461号	3.2	6.0	1972	2023	Ⅰ																						
946	N-1橋	市道N-233号	2.2	4.6	1972	2023	Ⅱ									修繕										1,100	1,100	主桁,下部工
947	N-2橋	市道N-235号	2.0	4.6	1972	2023	Ⅱ									修繕										1,100	1,100	主桁,下部工
948	J-4橋	市道幹63号	7.0	3.0	1972	2023	Ⅰ																						
949	P-5橋	市道P-23号	2.8	5.4	1972	2023	Ⅰ																						
951	P-7橋	市道P-9号	2.3	39.5	1972	2023	Ⅰ																						
952	P-2橋	市道P-8号	2.4	4.8	1956	2021	Ⅰ																						
953	1-131-1号橋	市道J-131号	2.7	4.2	1972	2023	Ⅰ																						
955	Q-1橋	市道Q-796号	2.7	6.0	1972	2023	Ⅰ																						
956	23-3号橋	市道幹47号	2.6	7.5	1972	2023	Ⅰ																						
957	V-1橋	市道V-107号	3.1	3.3	1972	2020	Ⅰ																						
959	F-12橋	市道F-647号	8.1	2.1	1972	2021.8	Ⅱ							修繕										1,900			1,900	主桁, 床版
																修繕費(千円)		22,000	85,800	92,200	98,800	87,300	97,000	80,400	98,800	93,400	96,700		
																設計費(千円)		5,500	21,500	23,100	24,700	21,800	24,300	20,100	24,700	23,400	24,200		
																点検費(千円)		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
																総費用(千円)		77,500	157,300	165,300	173,500	159,100	171,300	150,500	173,500	166,800	170,900		
																小計(千円)											1,565,700		
																消費税(10%)											156,570		
																総計(千円)											1,722,270		
